



COMUNE DI OSINI

COMUNE DI OSINI

PROVINCIA DI NURO

PROGETTO

INTERVENTO: "LEGGE REGIONALE 14/99 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA"

- CUP: H57I1900002000 -

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO



castello engineering

via Baronia 18, 09047 Selargius

tel. 070 401050

www.castelloassociati.com

P.IVA 03066160924

info@castelloassociati.com

ALLEGATO:

ELABORATO


08

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

COMMITTENTE: Comune di Osini, Piazza Europa n. 1 - 08040 - Osini (NU)

I PROGETTISTI:

dott. ing. Stefano Lobina



dott. ing. Fabio Stochino

dott. ing. Alessio Lobina

dott. ing. Alessandro Lobina

dott. ing. Giovanni Meloni

IL SINDACO

Dott. Tito Loi

IL R.U.P.

geom. Bruno Caboi

DATA Dicembre_2019

FASE DI PROGETTO
DEFINITIVO_ESECUTIVO

SCALA

REVISIONI

Collaboratori:

ALLEGATO "A"

Comune di Osini
Provincia di Nu

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori


(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Esecuzione lavori di illuminazione pubblica secondo la L.R. 14/99

COMMITTENTE: Comune di Osini

CANTIERE: Centro abitato Comune di Osini, Osini (Nu)

Osini, 06/12/2019



per presa visione

IL COMMITTENTE

(Geometra Caboi Bruno)

Ingegnere Lobina Stefano
Via Garibaldi 18
08020 Lodé (Nu)
Tel.: 3496241173 - Fax: \$EMPTY_CSP_10\$
E-Mail: stefanlobina@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	02/03/2020	02/03/2020
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	1	1	03/03/2020	03/03/2020
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	1	1	04/03/2020	04/03/2020
Realizzazione della recinzione del cantiere	1	E	1	1	05/03/2020	05/03/2020
Formazione cavidotti						
Scavi e demolizioni e rinterri per formazione di cavidotti	1	E	4	6	06/03/2020	11/03/2020
	1	E	5	5	16/03/2020	20/03/2020
Raccolta, trasporto e conferimento a discarica	1	E	4	4	09/03/2020	12/03/2020
	1	E	4	4	17/03/2020	20/03/2020
Ripristino pavimentazione	1	E	1	1	13/03/2020	13/03/2020
	1	E	1	1	23/03/2020	23/03/2020
Posa pozzetti di ispezione						
Scavi e demolizioni e rinterri per formazione di cavidotti	1	E	4	4	24/03/2020	27/03/2020
	1	E	4	4	31/03/2020	03/04/2020
Raccolta, trasporto e conferimento a discarica	1	E	3	3	25/03/2020	27/03/2020
	1	E	3	3	01/04/2020	03/04/2020
Ripristino pavimentazione	1	E	1	1	30/03/2020	30/03/2020
	1	E	1	1	06/04/2020	06/04/2020
Formazione plinto ancoraggio sostegno						
Scavi e demolizioni e rinterri per formazione di cavidotti	1	E	4	4	07/04/2020	10/04/2020
	1	E	4	6	15/04/2020	20/04/2020
Raccolta, trasporto e conferimento a discarica	1	E	3	3	08/04/2020	10/04/2020
	1	E	3	5	16/04/2020	20/04/2020
Ripristino pavimentazione	1	E	1	1	14/04/2020	14/04/2020
	1	E	1	1	21/04/2020	21/04/2020
Posa di pali per pubblica illuminazione	1	E	7	9	22/04/2020	30/04/2020
Montaggio di apparecchi illuminanti	1	E	10	12	04/05/2020	15/05/2020
Posa di cavi e collegamenti	1	E	11	15	18/05/2020	01/06/2020
Smobilizzo del cantiere	1	E	2	2	03/06/2020	04/06/2020

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA


Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Settimana -1		Settimana 1							
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g		Z1								
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g	1 g			Z1							
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g				Z1						
Realizzazione della recinzione del cantiere	1 g					Z1					
Formazione cavidotti	12 g										
Scavi e demolizioni e rinterrì per formazione di cavidotti	9 g						Z1				
Raccolta, trasporto e conferimento a discarica	8 g									Z1	
Ripristino pavimentazione	2 g										
Posa pozzetti di ispezione	10 g										
Scavi e demolizioni e rinterrì per formazione di cavidotti	8 g										
Raccolta, trasporto e conferimento a discarica	6 g										
Ripristino pavimentazione	2 g										
Formazione plinto ancoraggio sostegno	10 g										
Scavi e demolizioni e rinterrì per formazione di cavidotti	8 g										
Raccolta, trasporto e conferimento a discarica	6 g										
Ripristino pavimentazione	2 g										
Posa di pali per pubblica illuminazione	7 g										
Montaggio di apparecchi illuminanti	10 g										
Posa di cavi e collegamenti	11 g										
Smobilizzo del cantiere	2 g										
LEGENDA Zona:											
Z1 = ZONA UNICA											

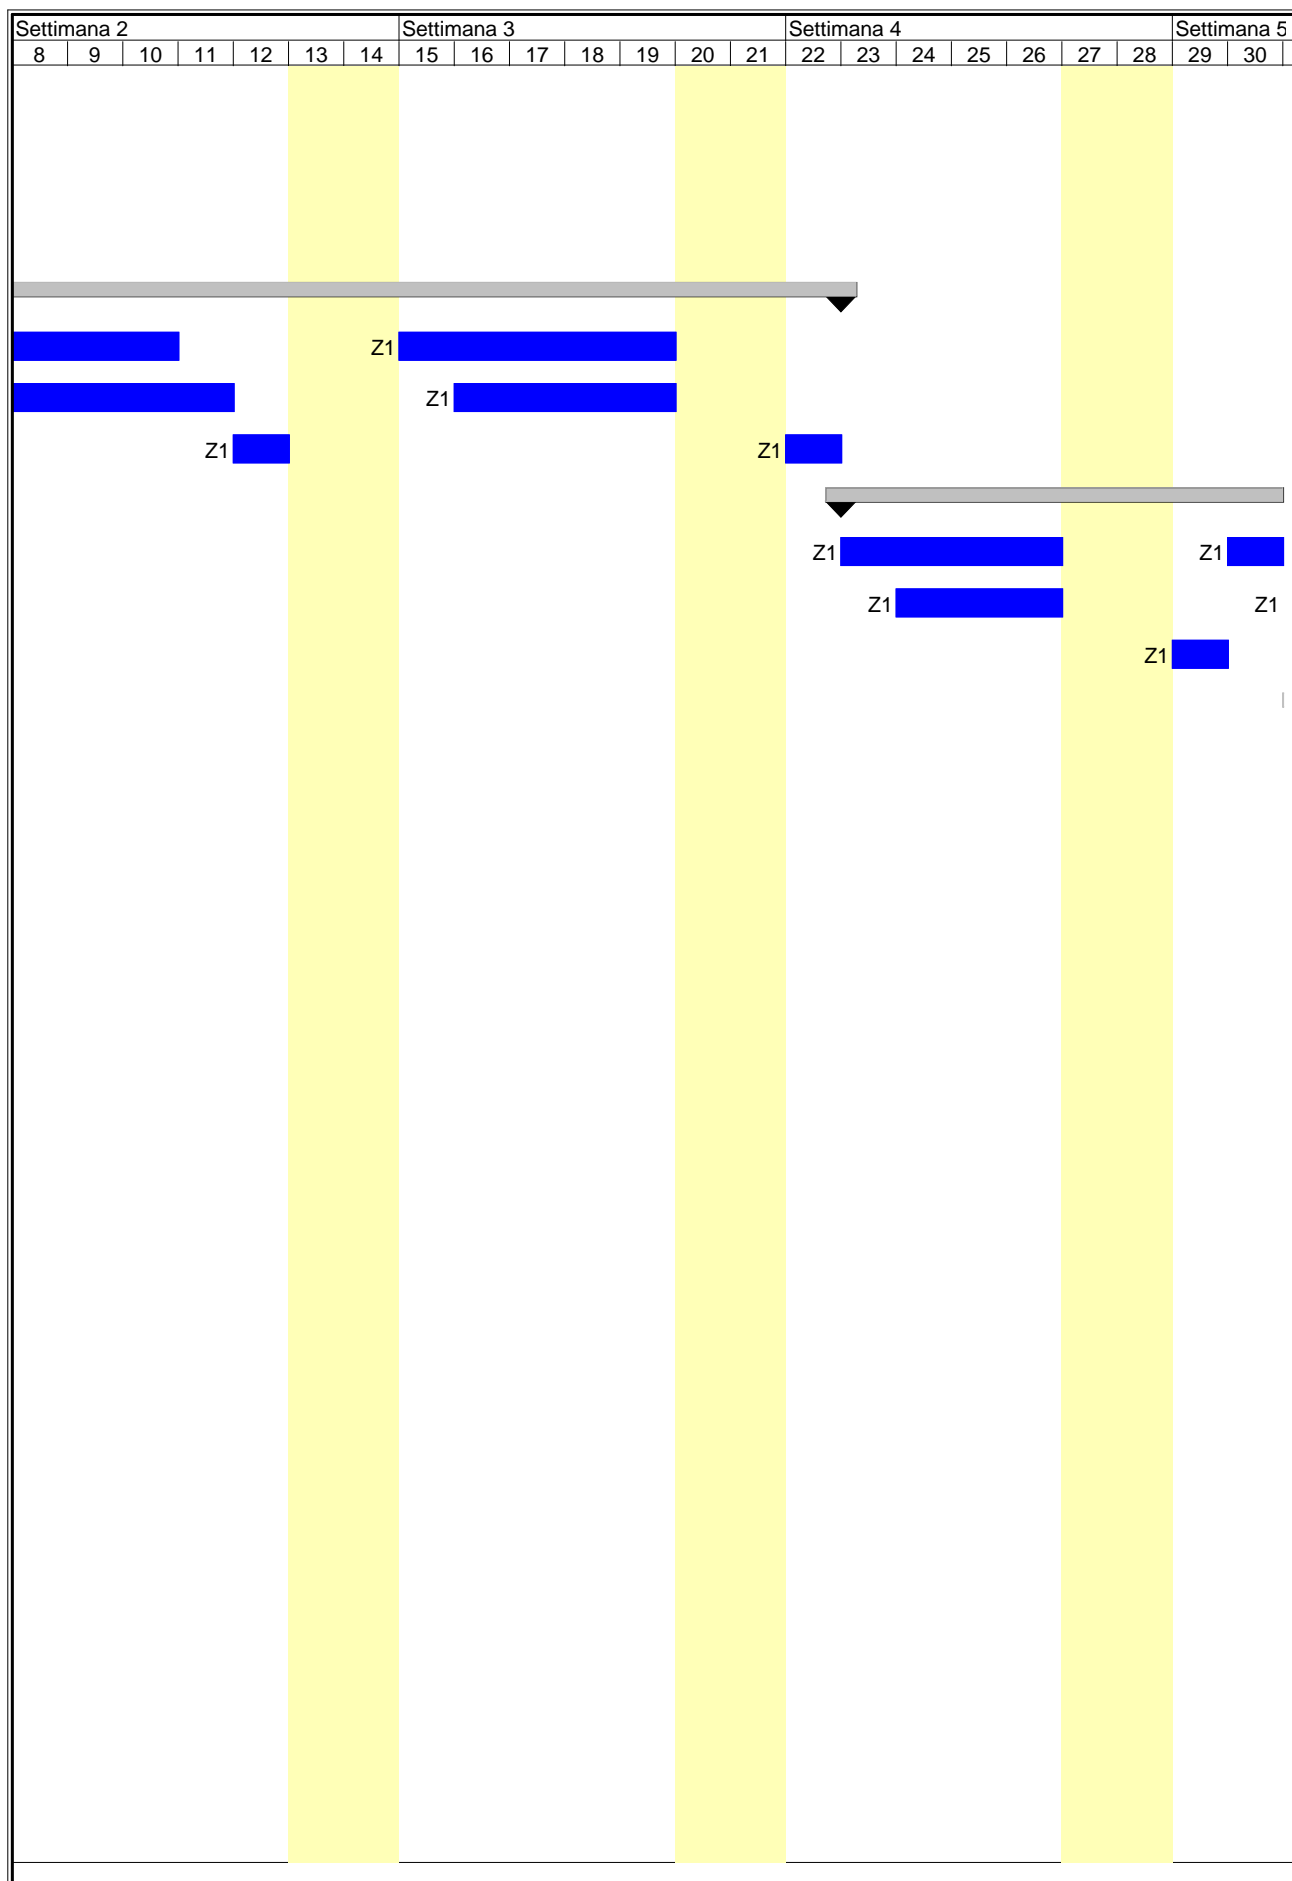

[illegible]

	Settimana 12							Settimana 13							Settimana 14							Settin
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
